#1811
MANHOUSE POOL

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**POOL/IMPORT**	**50 days**	**Mon 4/18/11**	**Fri 7/8/11**	
2	Site design	30 days	Mon 4/18/11	Fri 5/27/11	
3	Pool tile	30 days	Mon 4/18/11	Tue 5/31/11	
4	Site chains	40 days	Mon 4/18/11	Fri 6/10/11	
5	Coal tile	30 days	Mon 4/18/11	Fri 5/27/11	
6	Site lighting	40 days	Mon 4/18/11	Fri 6/10/11	
7	Rebar	15 days	Mon 4/18/11	Fri 5/6/11	
8	DRU	5 days	Mon 4/18/11	Fri 4/22/11	
9	Doors/Frames/Shutters	60 days	Mon 4/18/11	Fri 7/8/11	
10	Interior doors	60 days	Mon 4/18/11	Fri 7/8/11	
11	Finish hardware	60 days	Mon 4/18/11	Fri 7/8/11	
12	Roof framing	45 days	Mon 4/18/11	Fri 6/17/11	
13	Roofing assembly	40 days	Mon 4/18/11	Fri 6/10/11	
14	Copper gutters	20 days	Mon 4/18/11	Fri 5/13/11	
15	Shower enclosure	50 days	Mon 4/18/11	Fri 6/24/11	
16	Coral flooring	30 days	Mon 4/18/11	Fri 5/27/11	
17	Vanity / Tops	45 days	Mon 4/18/11	Fri 6/17/11	
18	Plumbing fixtures	45 days	Mon 4/18/11	Fri 6/17/11	
19	A/C Systems	45 days	Mon 4/18/11	Fri 6/17/11	
20	Electrical fixtures	45 days	Mon 4/18/11	Fri 6/17/11	
21					
22					
23	**Sitework**	**110 days**	**Mon 5/16/11**	**Fri 9/23/11**	
24	Underground utilities	15 days	Mon 4/18/11	Fri 5/6/11	
25	Pool tile	12 days	Wed 5/11/11	Thu 6/16/11	3
26	Diamond drills	5 days	Fri 6/17/11	Thu 6/23/11	25
27	Complete pool	0 days	Thu 6/23/11	Thu 6/23/11	26
28	Drainage	10 days	Mon 6/13/11	Fri 6/24/11	14
29	Pool deck	20 days	Mon 6/27/11	Fri 7/22/11	28
30	Coral tile	20 days	Mon 7/11/11	Fri 8/5/11	29FS-10 days
31	Stone walls	10 days	Mon 7/25/11	Fri 8/12/11	29
32	Finish grade	5 days	Mon 8/8/11	Fri 8/12/11	31
33	Landscaping	5 days	Mon 9/12/11	Fri 9/16/11	32
34	Site lighting	10 days	Mon 9/12/11	Fri 9/23/11	32
35					
36					
37	**Cottage #4**	**126 days**	**Mon 4/18/11**	**Mon 10/10/11**	
38	Basement walls	15 days	Mon 4/18/11	Fri 5/6/11	
39	Elevated slab	10 days	Mon 5/9/11	Fri 5/20/11	38
40	Waterproofing	2 days	Mon 5/9/11	Tue 5/10/11	38
41	Foundation drain	2 days	Mon 5/9/11	Tue 5/10/11	38
42	Cottage #4 backfill	3 days	Wed 5/11/11	Fri 5/13/11	41
43	DRU	10 days	Mon 6/6/11	Fri 6/17/11	39FS+10 days
44	Roof framing	10 days	Mon 5/26/11	Fri 6/10/11	45
45	Roof assembly	20 days	Mon 7/4/11	Fri 7/29/11	44
46	Copper gutters	5 days	Mon 7/25/11	Fri 7/29/11	45FS-5 days
47	Downspouts	2 days	Mon 8/26/11	Tue 8/31/11	43
48	Stone veneer	30 days	Mon 7/18/11	Fri 8/26/11	45FS-10 days
49	Set door frames	3 days	Mon 8/1/11	Wed 8/3/11	48
50	Interior framing	15 days	Mon 8/1/11	Fri 8/19/11	48
51	Interior plaster	15 days	Mon 8/22/11	Fri 9/9/11	50
52	Interior doors	5 days	Mon 8/22/11	Fri 8/26/11	50
53	Bathroom tile	5 days	Mon 9/12/11	Fri 9/16/11	51
54	Shower enclosure	1 day	Mon 9/19/11	Mon 9/19/11	53
55	Vanity / Tops	2 days	Mon 9/19/11	Tue 9/20/11	53
56	Accessories	2 days	Tue 9/26/11	Wed 9/21/11	54
57	Interior painting	5 days	Mon 9/12/11	Fri 9/16/11	51
58	Flooring	5 days	Mon 9/19/11	Fri 9/23/11	57
59	Plumbing rough	5 days	Mon 8/8/11	Fri 8/12/11	50FS-10 days
60	Plumbing finish	5 days	Wed 9/21/11	Tue 9/27/11	55
61	A/C Systems	30 days	Mon 8/22/11	Fri 9/30/11	50
62	Electrical Rough	5 days	Mon 8/8/11	Fri 8/12/11	50FS-10 days
63	Electrical Finish	5 days	Mon 9/26/11	Fri 9/30/11	58
64	Punch List	3 days	Mon 10/3/11	Wed 10/5/11	63
65	Clean up	2 days	Thu 10/6/11	Fri 10/7/11	64
66	Inspection	1 day	Mon 10/10/11	Mon 10/10/11	65
67	Completion	0 days	Mon 10/10/11	Mon 10/10/11	66

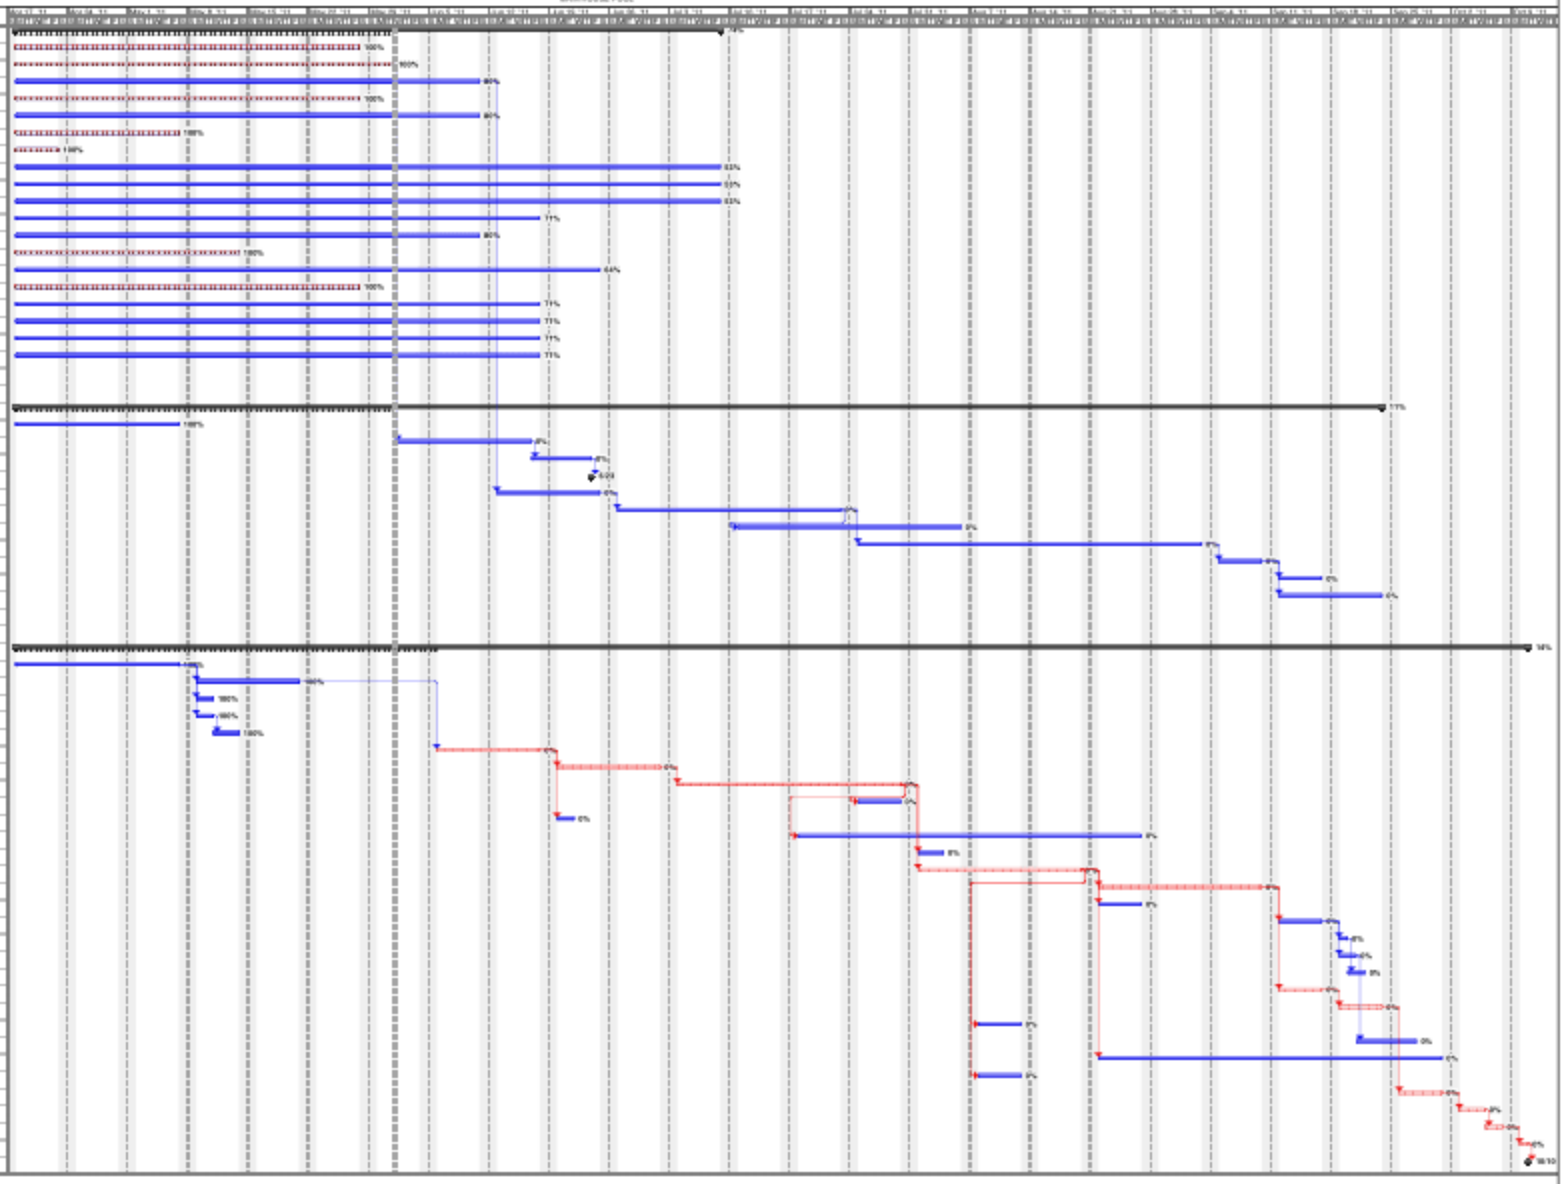

Project: 1811 Update 31May11
Date: Wed 6/1/11

Critical | Critical Progress | Split | Baseline | Baseline Milestone | Summary Progress | Project Summary | External Milestone
Critical Split | Task | Task Progress | Baseline Split | Milestone | Summary | External Tasks | Deadline

EFTA01071349
